

EKZ Leuchtenprogrammierung


Legende:



Projektanfangsdatum: 18.04.2024

Scrollschrittweite: 13

Meilensteinbeschreibung	Kategorie	Zugewiesen zu	Fortschritt	Start	Tage
Vorbereitung			0%		
Anreise Vormittags	Im Plan			02.05.2024	1
ab 1300 Instruktion	Im Plan	EKZ		02.05.2024	1
Übergabe Material	Im Plan	Mischa		02.05.2024	1
Einschulung Kappel am Albis (27 St.)	Mittleres Risiko	Mischa		02.05.2024	1
Woche 18 (243 St.)			0%		
Kappel am Albis (27 St.)	Mittleres Risiko			03.05.2024	2
Mettmenstetten (103 St.)	Mittleres Risiko			03.05.2024	2
Hausen a. A. (79 St.)	Mittleres Risiko			04.05.2024	1
Langnau a.A. (34 St.)	Mittleres Risiko			04.05.2024	1
Woche 19 (350 St.)			0%		
Hausen a. A., Langnau a.A.	Mittleres Risiko			06.05.2024	1
Adliswil (88 St.)	Mittleres Risiko			06.05.2024	3
Rüschlikon (53 St)	Mittleres Risiko			06.05.2024	3
Kilchberg (85 St)	Mittleres Risiko			06.05.2024	3
Thalwil (5 St.)	Mittleres Risiko			06.05.2024	3
Oberrieden (2 St.)	Mittleres Risiko			06.05.2024	3
Horgen (33 St.)	Hohes Risiko			08.05.2024	1
Wädenswil (154 St.)	Mittleres Risiko			08.05.2024	1
Obfelden (48 St.)	Mittleres Risiko			08.05.2024	1
Auffahrt				09.05.2024	4
Woche 20 (706 St.)			0%		
Wädenswil Obfelden	Mittleres Risiko			13.05.2024	2

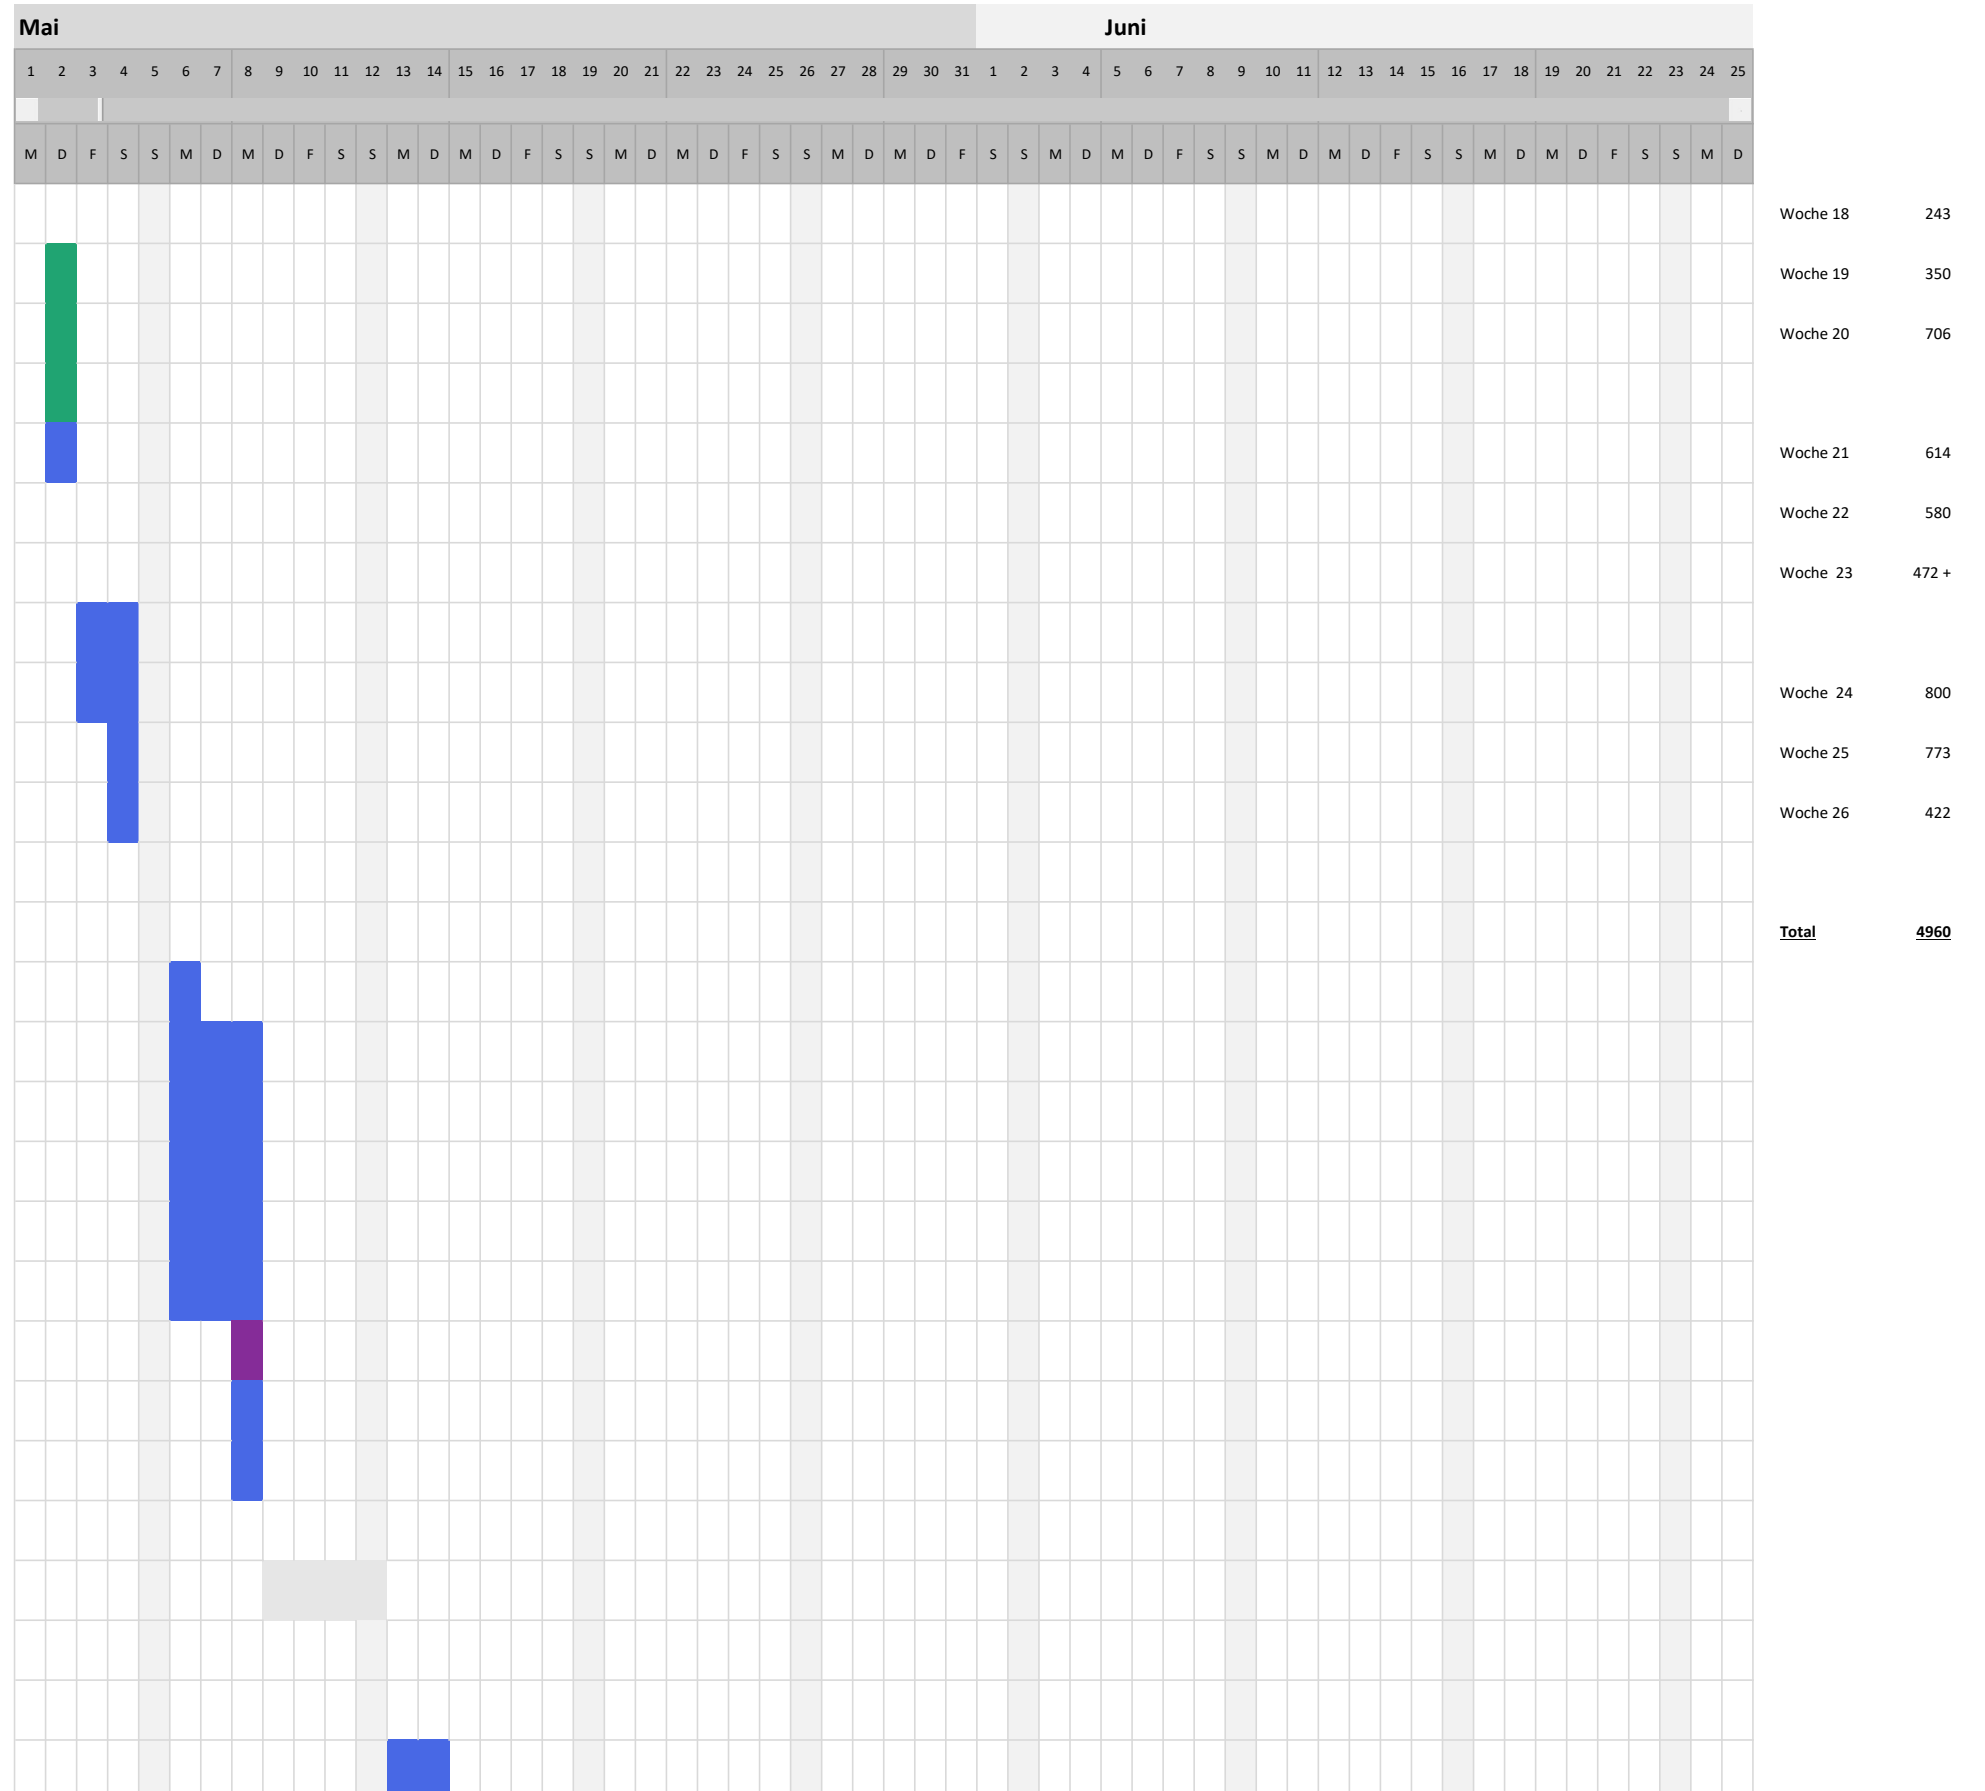

Projektanfangsdatum: 18.04.2024

Scrollschrittweite: 13

Meilensteinbeschreibung	Kategorie	Zugewiesen zu	Fortschritt	Start	Tage
Ottenbach (34 St.)	Mittleres Risiko			14.05.2024	3
Hedingen (85 St.)	Mittleres Risiko			14.05.2024	3
Affoltern a. A. (62 St.)	Mittleres Risiko			14.05.2024	3
Stallikon (55 St.)	Mittleres Risiko			14.05.2024	3
Bonstetten (107 St.)	Mittleres Risiko			16.05.2024	3
Wettswil a. Albis (54 St.)	Mittleres Risiko			16.05.2024	3
Schlieren (109 St.)	Mittleres Risiko			16.05.2024	3
Uitikon (82 St.)	Mittleres Risiko			18.05.2024	1
Pfingsten				19.05.2024	2
Woche 21 (614 St.)			0%		
Uitikon	Mittleres Risiko			21.05.2024	1
Birmensdor(3 St.)	Mittleres Risiko			21.05.2024	2
Urdorf (7 St.)	Mittleres Risiko			21.05.2024	2
Weiningen (13 St.)	Mittleres Risiko			21.05.2024	2
Dietikon (97 St.)	Mittleres Risiko			21.05.2024	2
Unter-Engstringen (43 St.)	Mittleres Risiko			22.05.2024	2
Ober-Engstringen (1 St.)	Mittleres Risiko			22.05.2024	2
Regensdorf (77 St.)	Mittleres Risiko			22.05.2024	2
Geroldswil (5 St.)	Mittleres Risiko			23.05.2024	2
Oetwil (4 St.)	Mittleres Risiko			23.05.2024	2
Dällikon (6 St.)	Mittleres Risiko			23.05.2024	2
Buchs (38 St.)	Mittleres Risiko			23.05.2024	2
Boppelsen (58 St.)	Mittleres Risiko			23.05.2024	2
Dielsdorf (49 St.)	Mittleres Risiko			24.05.2024	2
Niederhasli (34 St.)	Mittleres Risiko			24.05.2024	2
Steinmaur (41 St.)	Mittleres Risiko			24.05.2024	2
Niederglatt (10. St)	Mittleres Risiko			24.05.2024	2
Stadel (52 St.)	Mittleres Risiko			25.05.2024	1
Bachs (16 St.)	Mittleres Risiko			25.05.2024	1



Projektanfangsdatum: 18.04.2024

Scrollschrittweite: 13

Meilensteinbeschreibung	Kategorie	Zugewiesen zu	Fortschritt	Start	Tage
Schöfflisdorf (1 St.)	Mittleres Risiko			25.05.2024	1
Oberweningen (17 St.)	Mittleres Risiko			25.05.2024	1
Schleinikon (23 St.)	Mittleres Risiko			25.05.2024	1
Niederweningen (19 St.)	Mittleres Risiko			25.05.2024	1
Woche 22 (580 St.)			0%		
Stadel, Bachs, Schöfflisdorf, Oberweningen, Schleinikon, Niederw.	Mittleres Risiko			27.05.2024	1
Oetelfingen (135 St.)	Hohes Risiko			27.05.2024	2
Weiach (28 St.)	Hohes Risiko			28.05.2024	2
Hüntwangen (35 St.)	Mittleres Risiko			28.05.2024	2
Eglisau (15 St.)	Mittleres Risiko			28.05.2024	2
Höri (7 St.)	Mittleres Risiko			28.05.2024	2
Neerach (21 St.)	Mittleres Risiko			28.05.2024	2
Rümlang (79 St.)	Hohes Risiko			29.05.2024	2
Oberglatt (12 St.)	Hohes Risiko			29.05.2024	2
Bülach (136 St.)	Hohes Risiko	mit Verkehrsdienst		30.05.2024	3
Freienstein-Teufen (20 St.)	Mittleres Risiko			01.06.2024	1
Dättlikon (7 St.)	Mittleres Risiko			01.06.2024	1
Pfungen (26 St.)	Mittleres Risiko			01.06.2024	1
Brütten (9 St.)	Mittleres Risiko			01.06.2024	1
Nürens Dorf (41 St.)	Mittleres Risiko			01.06.2024	1
Lufingen (3 St.)	Mittleres Risiko			01.06.2024	1
Winkel (20 St.)	Mittleres Risiko			01.06.2024	1


Woche 23 (472 + ??? St.)			0%		
Freienstein-Teufen, Dättlikon, Pfungen, Brütten, Nürens Dorf	Mittleres Risiko			03.06.2024	1
Embrach (174 St.)	Hohes Risiko	mit Verkehrsdienst		03.06.2024	4
Bassersdorf (56 St.)	Hohes Risiko	mit Verkehrsdienst		03.06.2024	4
Kloten (242 St.)	Mittleres Risiko			06.06.2024	3
Fehraltorf (??? St.)	Mittleres Risiko			08.06.2024	1



Projektanfangsdatum: 18.04.2024

Scrollschrittweite: 13

Meilensteinbeschreibung	Kategorie	Zugewiesen zu	Fortschritt	Start	Tage
Woche 24 (800 St.)			0%		
Buch am Irchel (24 St.)	Mittleres Risiko			10.06.2024	2
Volken (23 St.)	Mittleres Risiko			10.06.2024	2
Neftenbach (40 St.)	Mittleres Risiko			10.06.2024	2
Hettlingen (7 St.)	Mittleres Risiko			10.06.2024	2
Seuzach (37 St.)	Mittleres Risiko			10.06.2024	2
Andelfingen (40 St.)	Hohes Risiko			11.06.2024	2
Klein-Andelfingen (1St.)	Mittleres Risiko			11.06.2024	2
Trüllikon (14St.)	Mittleres Risiko			11.06.2024	2
Laufen-Uhwiesen (28 St.)	Mittleres Risiko			11.06.2024	2
Feuerthalen (38 St.)	Mittleres Risiko			11.06.2024	2
Dachsen (8St.)	Mittleres Risiko			11.06.2024	2
Stammheim (7St.)	Mittleres Risiko			11.06.2024	2
Ossingen (11St.)	Mittleres Risiko			12.06.2024	2
Thalheim a.d.Thur (1St.)	Mittleres Risiko			12.06.2024	2
Altikon (1St.)	Mittleres Risiko			12.06.2024	2
Dinhard (31 St.)	Mittleres Risiko			12.06.2024	2
Ellikon a. d. Thur (29 St.)	Mittleres Risiko			12.06.2024	2
Wiesendangen (8 St.)	Mittleres Risiko			12.06.2024	2
Hagenbuch (10 St.)	Mittleres Risiko			12.06.2024	2
Elgg (12 St.)	Mittleres Risiko			12.06.2024	2
Elsau, Räterschen, Rümikon (2 St.)	Hohes Risiko			12.06.2024	2
Schlatt (22 St.)	Mittleres Risiko			12.06.2024	2
Zell (10 St.)	Mittleres Risiko			13.06.2024	2
Russikon (7 St.)	Mittleres Risiko			13.06.2024	2
Weisslingen (4 St.)	Mittleres Risiko			13.06.2024	2
Turbenthal (60 St.)	Mittleres Risiko			13.06.2024	2
Wila (1 St.)	Mittleres Risiko			13.06.2024	2
Hittnau (5 St.)	Mittleres Risiko			13.06.2024	2
Bauma (22 St.)	Mittleres Risiko			13.06.2024	2
Bäretswil (23 St.)	Mittleres Risiko			13.06.2024	2

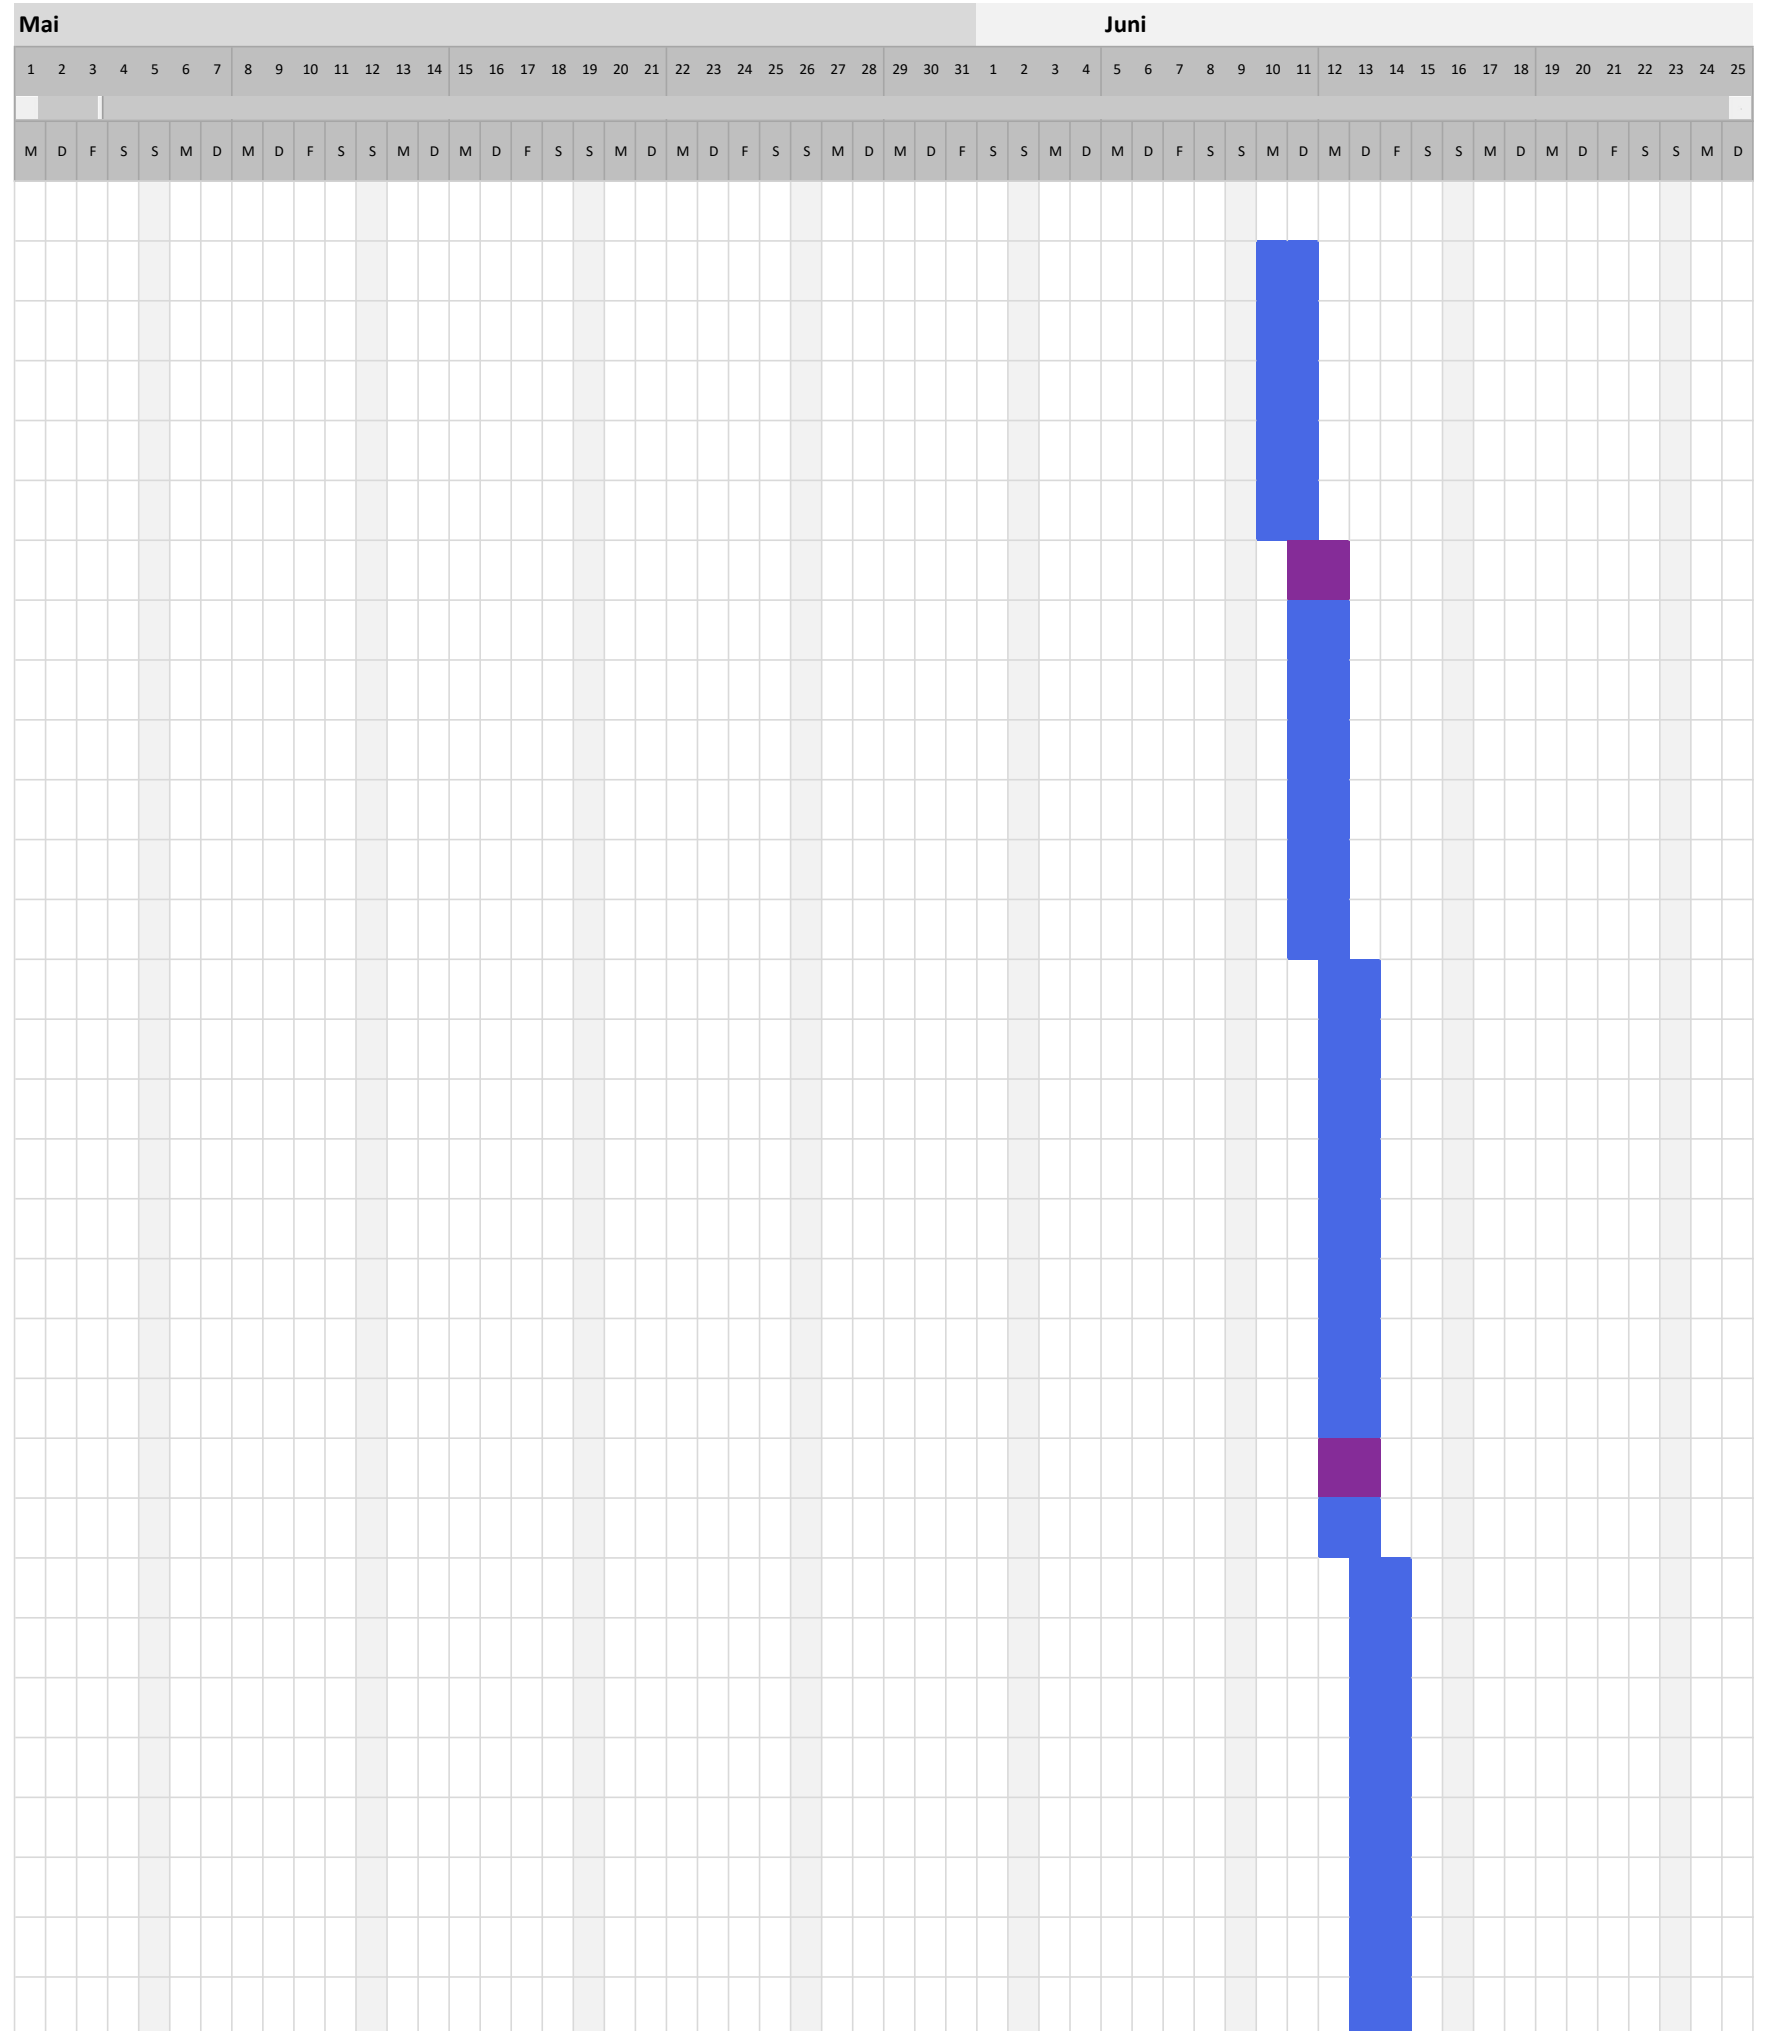

Projektanfangsdatum: 18.04.2024

Scrollschrittweite: 13

Meilensteinbeschreibung	Kategorie	Zugewiesen zu	Fortschritt	Start	Tage
Fiscenthal (42 St.)	Mittleres Risiko			14.06.2024	2
Hinwil (165 St.)	Mittleres Risiko			14.06.2024	2
Dürnten (14 St.)	Mittleres Risiko			14.06.2024	2
Hombrechtikon (27 St.)	Mittleres Risiko			14.06.2024	2
Egg (26 St.)	Mittleres Risiko			14.06.2024	2
Woche 25 (773 St.)			0%		
Fiscenthal, Hinwil, Dürnten, Hombrechtikon, Egg	Mittleres Risiko			17.06.2024	1
Wald (11 St.)	Hohes Risiko			17.06.2024	2
Bubikon (2 St.)	Hohes Risiko			17.06.2024	2
Grünigen (3 St.)	Hohes Risiko			17.06.2024	2
Wetzikon (1 St.)	Hohes Risiko			17.06.2024	2
Pfäffikon (71 St.)	Hohes Risiko			17.06.2024	2
Uster (151 St.)	Hohes Risiko			17.06.2024	3
Oetwil am See (59 St.)	Mittleres Risiko			19.06.2024	2
Mönchaldorf (3 St.)	Mittleres Risiko			19.06.2024	2
Maur (31 St.)	Mittleres Risiko			19.06.2024	2
Herrliberg (34 St.)	Hohes Risiko			19.06.2024	2
Küsnacht (4 St.)	Hohes Risiko			19.06.2024	2
Zollikon (24 St.)	Hohes Risiko			20.06.2024	3
Dübendorf (185 St.)	Hohes Risiko			20.06.2024	3
Zumikon (57 St.)	Mittleres Risiko			20.06.2024	3
Schwerzenbach (1 St.)	Mittleres Risiko			22.06.2024	1
Volketswil (59 St.)	Mittleres Risiko			22.06.2024	1
Illnau-Effretikon (77 St.)	Mittleres Risiko			22.06.2024	1

